

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	**1**	**PROYECTO BOTÁNICA PUNTA CANA**	**392 días**	**lun 07/09/26**	**mié 09/02/28**	**0%**
2	**1.1**	**FASE 0: IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS**	**21 días**	**lun 07/09/26**	**mié 30/09/26**	**13%**
3	1.1.1	Vallado perimetral de obra (provisional)	21 días	lun 07/09/26	mié 30/09/26	25%
4	1.1.2	Instalación de oficinas y almacenes	5 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	0%
5	1.1.3	Instalación de campamento de materiales	5 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	0%
6	1.1.4	Acometidas provisionales (agua, luz, saneamiento)	5 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	0%
7	1.1.5	Instalación de grúa torre, incluidas zapatas y puesta en servicio	6 días	vie 18/09/26	jue 24/09/26	0%
8	**1.2**	**FASE 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENO**	**10 días**	**jue 17/09/26**	**lun 28/09/26**	**75%**
9	1.2.1	Relleno final hasta cota de desplante, nivelación, compactación y ensayos	10 días	jue 17/09/26	lun 28/09/26	75%
10	1.2.2	Aprobación topográfica y geotécnica de la plataforma	0 días	lun 28/09/26	lun 28/09/26	0%
11	**1.3**	**FASE 2: CIMENTACIÓN**	**58 días**	**mar 29/09/26**	**mar 08/12/26**	**0%**
12	**1.3.1**	**BLOQUE J4**	**49 días**	**mar 29/09/26**	**vie 27/11/26**	**0%**
13	1.3.1.1	Excavación de zanjas y zapatas – Bloque J4	3 días	mar 29/09/26	jue 01/10/26	0%
14	1.3.1.2	Encofrado de zapatas – Bloque J4	5 días	vie 02/10/26	mié 07/10/26	0%
15	1.3.1.3	Ferralla de cimentación – Bloque J4	6 días	jue 08/10/26	mié 14/10/26	0%
16	1.3.1.4	Hormigonado de zapatas – Bloque J4	4 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26	0%
17	1.3.1.5	Platea de cimentación de 25 cm – Bloque J4	8 días	mar 20/10/26	mié 28/10/26	0%
18	1.3.1.6	Pilares y muros desde platea hasta Forjado P1, incluidos arranqu	7 días	jue 29/10/26	jue 05/11/26	0%
19	1.3.1.7	Instalaciones principales enterradas BT, SAN, FONT y TLC, inclu	6 días	mar 10/11/26	lun 16/11/26	0%
20	1.3.1.8	Relleno de caliche 70 cm, compactación por capas y ensayos – B5 días		mar 17/11/26	sáb 21/11/26	0%
21	1.3.1.9	Losa de hormigón armado de piso sobre relleno compactado, e = 5 días		lun 23/11/26	vie 27/11/26	0%
22	**1.3.2**	**BLOQUE J3**	**49 días**	**vie 02/10/26**	**mar 01/12/26**	**0%**
23	1.3.2.1	Excavación de zanjas y zapatas – Bloque J3	3 días	vie 02/10/26	lun 05/10/26	0%
24	1.3.2.2	Encofrado de zapatas – Bloque J3	5 días	mar 06/10/26	sáb 10/10/26	0%
25	1.3.2.3	Ferralla de cimentación – Bloque J3	6 días	lun 12/10/26	sáb 17/10/26	0%
26	1.3.2.4	Hormigonado de zapatas – Bloque J3	4 días	lun 19/10/26	jue 22/10/26	0%
27	1.3.2.5	Platea de cimentación de 25 cm – Bloque J3	8 días	vie 23/10/26	sáb 31/10/26	0%
28	1.3.2.6	Pilares y muros desde platea hasta Forjado P1, incluidos arranqu	7 días	lun 02/11/26	jue 12/11/26	0%
29	1.3.2.7	Instalaciones principales enterradas BT, SAN, FONT y TLC, inclu	6 días	vie 13/11/26	jue 19/11/26	0%
30	1.3.2.8	Relleno de caliche 70 cm, compactación por capas y ensayos – B5 días		vie 20/11/26	mié 25/11/26	0%
31	1.3.2.9	Losa de hormigón armado de piso sobre relleno compactado, e = 5 días		jue 26/11/26	mar 01/12/26	0%
32	**1.3.3**	**BLOQUE J2**	**49 días**	**mar 06/10/26**	**vie 04/12/26**	**0%**
33	1.3.3.1	Excavación de zanjas y zapatas – Bloque J2	3 días	mar 06/10/26	jue 08/10/26	0%
34	1.3.3.2	Encofrado de zapatas – Bloque J2	5 días	vie 09/10/26	mié 14/10/26	0%
35	1.3.3.3	Ferralla de cimentación – Bloque J2	6 días	jue 15/10/26	mié 21/10/26	0%
36	1.3.3.4	Hormigonado de zapatas – Bloque J2	4 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26	0%
37	1.3.3.5	Platea de cimentación de 25 cm – Bloque J2	8 días	mar 27/10/26	mié 04/11/26	0%
38	1.3.3.6	Pilares y muros desde platea hasta Forjado P1, incluidos arranqu	7 días	jue 05/11/26	lun 16/11/26	0%
39	1.3.3.7	Instalaciones principales enterradas BT, SAN, FONT y TLC, inclu	6 días	mar 17/11/26	lun 23/11/26	0%
40	1.3.3.8	Relleno de caliche 70 cm, compactación por capas y ensayos – B5 días		mar 24/11/26	sáb 28/11/26	0%
41	1.3.3.9	Losa de hormigón armado de piso sobre relleno compactado, e = 5 días		lun 30/11/26	vie 04/12/26	0%
42	**1.3.4**	**BLOQUE J1**	**49 días**	**mié 09/10/26**	**mar 08/12/26**	**0%**
43	1.3.4.1	Excavación de zanjas y zapatas – Bloque J1	3 días	vie 09/10/26	lun 12/10/26	0%
44	1.3.4.2	Encofrado de zapatas – Bloque J1	5 días	mar 13/10/26	sáb 17/10/26	0%
45	1.3.4.3	Ferralla de cimentación – Bloque J1	6 días	lun 19/10/26	sáb 24/10/26	0%
46	1.3.4.4	Hormigonado de zapatas – Bloque J1	4 días	lun 26/10/26	jue 29/10/26	0%
47	1.3.4.5	Platea de cimentación de 25 cm – Bloque J1	8 días	vie 30/10/26	mié 11/11/26	0%
48	1.3.4.6	Pilares y muros desde platea hasta Forjado P1, incluidos arranques sísmicos – Bloque J1	7 días	jue 12/11/26	jue 19/11/26	0%
49	1.3.4.7	Instalaciones principales enterradas BT, SAN, FONT y TLC, incluidas pruebas e inspección – Bloque J1	6 días	vie 20/11/26	jue 26/11/26	0%
50	1.3.4.8	Relleno de caliche 70 cm, compactación por capas y ensayos – Bloque J1	5 días	vie 27/11/26	mié 02/12/26	0%
51	1.3.4.9	Losa de hormigón armado de piso sobre relleno compactado, e = 15 cm – Bloque J1	5 días	jue 03/12/26	mar 08/12/26	0%
52	**1.4**	**FASE 3: ESTRUCTURA VERTICAL Y CUBIERTA**	**137 días**	**mar 10/11/26**	**lun 03/05/27**	**0%**
53	**1.4.1**	**PLANTA 1**	**36 días**	**mar 10/11/26**	**lun 21/12/26**	**0%**
54	1.4.1.1	Forjado – Planta 1 - Bloque J4	15 días	mar 10/11/26	jue 26/11/26	0%
55	1.4.1.2	Forjado – Planta 1 - Bloque J3	15 días	vie 13/11/26	lun 30/11/26	0%
56	1.4.1.3	Forjado – Planta 1 - Bloque J2	15 días	mar 17/11/26	jue 03/12/26	0%
57	1.4.1.4	Forjado – Planta 1 - Bloque J1	15 días	vie 20/11/26	lun 07/12/26	0%
58	1.4.1.5	Pilares y muros desde Forjado P1 hasta Forjado P2 – J4	12 días	vie 27/11/26	jue 10/12/26	0%
59	1.4.1.6	Pilares y muros desde Forjado P1 hasta Forjado P2 – J3	12 días	mar 01/12/26	lun 14/12/26	0%
60	1.4.1.7	Pilares y muros desde Forjado P1 hasta Forjado P2 – J2	12 días	vie 04/12/26	jue 17/12/26	0%
61	1.4.1.8	Pilares y muros desde Forjado P1 hasta Forjado P2 – J1	12 días	mar 08/12/26	lun 21/12/26	0%
62	**1.4.2**	**PLANTA 2**	**36 días**	**vie 11/12/26**	**mié 03/02/27**	**0%**
63	1.4.2.1	Forjado – Planta 2 - Bloque J4	15 días	vie 11/12/26	vie 08/01/27	0%
64	1.4.2.2	Forjado – Planta 2 - Bloque J3	15 días	mar 15/12/26	mar 12/01/27	0%
65	1.4.2.3	Forjado – Planta 2 - Bloque J2	15 días	vie 18/12/26	vie 15/01/27	0%
66	1.4.2.4	Forjado – Planta 2 - Bloque J1	15 días	mar 22/12/26	mar 19/01/27	0%
67	1.4.2.5	Pilares y muros desde Forjado P2 hasta Forjado P3 – J4	12 días	sáb 09/01/27	vie 22/01/27	0%
68	1.4.2.6	Pilares y muros desde Forjado P2 hasta Forjado P3 – J3	12 días	mié 13/01/27	mié 27/01/27	0%
69	1.4.2.7	Pilares y muros desde Forjado P2 hasta Forjado P3 – J2	12 días	sáb 16/01/27	sáb 30/01/27	0%
70	1.4.2.8	Pilares y muros desde Forjado P2 hasta Forjado P3 – J1	12 días	mié 20/01/27	mié 03/02/27	0%
71	**1.4.3**	**PLANTA 3**	**36 días**	**sáb 23/01/27**	**sáb 06/03/27**	**0%**
72	1.4.3.1	Forjado – Planta 3 - Bloque J4	15 días	sáb 23/01/27	mié 10/02/27	0%
73	1.4.3.2	Forjado – Planta 3 - Bloque J3	15 días	jue 28/01/27	sáb 13/02/27	0%
74	1.4.3.3	Forjado – Planta 3 - Bloque J2	15 días	lun 01/02/27	mié 17/02/27	0%
75	1.4.3.4	Forjado – Planta 3 - Bloque J1	15 días	jue 04/02/27	sáb 20/02/27	0%
76	1.4.3.5	Pilares y muros desde Forjado P3 hasta Forjado P4 – J4	12 días	jue 11/02/27	mié 24/02/27	0%
77	1.4.3.6	Pilares y muros desde Forjado P3 hasta Forjado P4 – J3	12 días	lun 15/02/27	sáb 27/02/27	0%
78	1.4.3.7	Pilares y muros desde Forjado P3 hasta Forjado P4 – J2	12 días	jue 18/02/27	mié 03/03/27	0%
79	1.4.3.8	Pilares y muros desde Forjado P3 hasta Forjado P4 – J1	12 días	jue 22/02/27	sáb 06/03/27	0%
80	**1.4.4**	**PLANTA 4**	**36 días**	**jue 25/02/27**	**vie 09/04/27**	**0%**
81	1.4.4.1	Forjado – Planta 4 - Bloque J4	15 días	jue 25/02/27	sáb 13/03/27	0%
82	1.4.4.2	Forjado – Planta 4 - Bloque J3	15 días	lun 01/03/27	mié 17/03/27	0%
83	1.4.4.3	Forjado – Planta 4 - Bloque J2	15 días	jue 04/03/27	sáb 20/03/27	0%
84	1.4.4.4	Forjado – Planta 4 - Bloque J1	15 días	lun 08/03/27	mié 24/03/27	0%
85	1.4.4.5	Pilares y muros desde Forjado P4 hasta Cubierta – J4	12 días	lun 15/03/27	mar 30/03/27	0%
86	1.4.4.6	Pilares y muros desde Forjado P4 hasta Cubierta – J3	12 días	jue 18/03/27	vie 02/04/27	0%
87	1.4.4.7	Pilares y muros desde Forjado P4 hasta Cubierta – J2	12 días	lun 22/03/27	mar 06/04/27	0%
88	1.4.4.8	Pilares y muros desde Forjado P4 hasta Cubierta – J1	12 días	jue 25/03/27	vie 09/04/27	0%
89	**1.4.5**	**CUBIERTA**	**20 días**	**sáb 10/04/27**	**lun 03/05/27**	**0%**
90	1.4.5.1	Cubierta de RoofTop y restos	20 días	sáb 10/04/27	lun 03/05/27	0%
91	**1.5**	**FASE 4: FACHADAS E IMPERMEABILIZACIONES**	**58 días**	**mar 13/04/27**	**vie 18/06/27**	**0%**
92	1.5.1	Impermeabilización de cubierta - Bloque J4	7 días	mar 04/05/27	mar 11/05/27	0%
93	1.5.2	Impermeabilización de cubierta - Bloque J3	7 días	mié 12/05/27	mié 19/05/27	0%
94	1.5.3	Impermeabilización de cubierta - Bloque J2	7 días	jue 20/05/27	jue 27/05/27	0%
95	1.5.4	Impermeabilización de cubierta - Bloque J1	7 días	vie 28/05/27	vie 04/06/27	0%
96	1.5.5	Fachada GRC - Bloque J4	21 días	mar 13/04/27	jue 06/05/27	0%
97	1.5.6	Fachada GRC - Bloque J3	21 días	vie 16/04/27	lun 10/05/27	0%
98	1.5.7	Fachada GRC - Bloque J2	21 días	mar 20/04/27	jue 13/05/27	0%
99	1.5.8	Fachada GRC- Bloque J1	21 días	vie 23/04/27	lun 17/05/27	0%
100	1.5.9	Carpintería de aluminio - Bloque J4	28 días	vie 07/05/27	mar 08/06/27	0%
101	1.5.10	Carpintería de aluminio - Bloque J3	28 días	mar 11/05/27	vie 11/06/27	0%
102	1.5.11	Carpintería de aluminio - Bloque J2	28 días	vie 14/05/27	mar 15/06/27	0%
103	1.5.12	Carpintería de aluminio - Bloque J1	28 días	mar 18/05/27	vie 18/06/27	0%
104	**1.6**	**FASE 5: TABIQUERÍA EXTERIOR E INTERIOR**	**124 días**	**sáb 09/01/27**	**sáb 05/06/27**	**0%**
105	1.6.1	Muros de bloque 150 mm - Bloque J4	45 días	sáb 09/01/27	mié 03/03/27	0%
106	1.6.2	Muros de bloque 150 mm - Bloque J3	45 días	mié 13/01/27	sáb 06/03/27	0%
107	1.6.3	Muros de bloque 150 mm - Bloque J2	45 días	sáb 16/01/27	mié 10/03/27	0%
108	1.6.4	Muros de bloque 150 mm - Bloque J1	45 días	mié 20/01/27	sáb 13/03/27	0%
109	1.6.5	Tabique pladur 89 mm - Bloque J4	40 días	jue 04/03/27	mié 21/04/27	0%
110	1.6.6	Tabique pladur 89 mm - Bloque J3	40 días	lun 08/03/27	sáb 24/04/27	0%
111	1.6.7	Tabique pladur 89 mm - Bloque J2	40 días	jue 11/03/27	mié 28/04/27	0%
112	1.6.8	Tabique pladur 89 mm - Bloque J1	40 días	lun 15/03/27	sáb 01/05/27	0%
113	1.6.9	Trasdosados - Bloque J4	30 días	jue 22/04/27	mié 26/05/27	0%
114	1.6.10	Trasdosados - Bloque J3	30 días	lun 26/04/27	sáb 29/05/27	0%
115	1.6.11	Trasdosados - Bloque J2	30 días	jue 29/04/27	mié 02/06/27	0%
116	1.6.12	Trasdosados - Bloque J1	30 días	lun 03/05/27	sáb 05/06/27	0%
117	**1.7**	**FASE 6: INSTALACIONES EN VERTICAL**	**149 días**	**sáb 23/01/27**	**lun 19/07/27**	**0%**
118	1.7.1	Electricidad - Bloque J4	140 días	sáb 23/01/27	jue 08/07/27	0%
119	1.7.2	Electricidad - Bloque J3	140 días	jue 28/01/27	lun 12/07/27	0%
120	1.7.3	Electricidad - Bloque J2	140 días	lun 01/02/27	jue 15/07/27	0%
121	1.7.4	Electricidad - Bloque J1	140 días	jue 04/02/27	lun 19/07/27	0%
122	1.7.5	Fontanería - Bloque J4	140 días	sáb 23/01/27	jue 08/07/27	0%
123	1.7.6	Fontanería - Bloque J3	140 días	jue 28/01/27	lun 12/07/27	0%
124	1.7.7	Fontanería - Bloque J2	140 días	lun 01/02/27	jue 15/07/27	0%
125	1.7.8	Fontanería - Bloque J1	140 días	jue 04/02/27	lun 19/07/27	0%
126	1.7.9	Saneamiento colgado - Bloque J4	140 días	sáb 23/01/27	jue 08/07/27	0%
127	1.7.10	Saneamiento colgado - Bloque J3	140 días	jue 28/01/27	lun 12/07/27	0%
128	1.7.11	Saneamiento colgado - Bloque J2	140 días	lun 01/02/27	jue 15/07/27	0%
129	1.7.12	Saneamiento colgado - Bloque J1	140 días	jue 04/02/27	lun 19/07/27	0%
130	1.7.13	Climatización - Bloque J4	140 días	sáb 23/01/27	jue 08/07/27	0%
131	1.7.14	Climatización - Bloque J3	140 días	jue 28/01/27	lun 12/07/27	0%
132	1.7.15	Climatización - Bloque J2	140 días	lun 01/02/27	jue 15/07/27	0%
133	1.7.16	Climatización - Bloque J1	140 días	jue 04/02/27	lun 19/07/27	0%
134	**1.8**	**FASE 7: PAÑETES Y REVESTIMIENTOS**	**61 días**	**jue 04/03/27**	**sáb 15/05/27**	**0%**
135	1.8.1	Pañete rústico exterior - Bloque J4	32 días	jue 04/03/27	lun 12/04/27	0%
136	1.8.2	Pañete rústico exterior - Bloque J3	32 días	lun 08/03/27	jue 15/04/27	0%
137	1.8.3	Pañete rústico exterior - Bloque J2	32 días	lun 11/03/27	lun 19/04/27	0%
138	1.8.4	Pañete rústico exterior - Bloque J1	32 días	lun 15/03/27	jue 22/04/27	0%
139	1.8.5	Pañete liso interior - Bloque J4	20 días	mar 13/04/27	mié 05/05/27	0%
140	1.8.6	Pañete liso interior - Bloque J3	20 días	vie 16/04/27	sáb 08/05/27	0%
141	1.8.7	Pañete liso interior - Bloque J2	20 días	mar 20/04/27	mié 12/05/27	0%
142	1.8.8	Pañete liso interior - Bloque J1	20 días	vie 23/04/27	sáb 15/05/27	0%
143	**1.9**	**FASE 8: SOLERAS, REVESTIMIENTOS Y APARATOS SANITARIOS**	**138 días**	**jue 04/03/27**	**vie 13/08/27**	**0%**
144	1.9.1	Soleras - Bloque J4	21 días	jue 04/03/27	mar 30/03/27	0%
145	1.9.2	Soleras - Bloque J3	21 días	lun 08/03/27	vie 02/04/27	0%
146	1.9.3	Soleras - Bloque J2	21 días	jue 11/03/27	mar 06/04/27	0%
147	1.9.4	Soleras - Bloque J1	21 días	lun 15/03/27	vie 09/04/27	0%
148	1.9.5	Gres porcelánico interior y alicatados - Bloque J4	29 días	mié 31/03/27	lun 03/05/27	0%
149	1.9.6	Gres porcelánico interior y alicatados - Bloque J3	29 días	sáb 03/04/27	jue 06/05/27	0%
150	1.9.7	Gres porcelánico interior y alicatados - Bloque J2	29 días	mié 07/04/27	lun 10/05/27	0%
151	1.9.8	Gres porcelánico interior y alicatados - Bloque J1	29 días	sáb 10/04/27	jue 13/05/27	0%
152	1.9.9	Inodoros y lavabos - Bloque J4	11 días	vie 09/07/27	mié 21/07/27	0%
153	1.9.10	Inodoros y lavabos - Bloque J3	11 días	mar 13/07/27	sáb 24/07/27	0%
154	1.9.11	Inodoros y lavabos - Bloque J2	11 días	vie 16/07/27	mié 28/07/27	0%
155	1.9.12	Inodoros y lavabos - Bloque J1	11 días	mar 20/07/27	sáb 31/07/27	0%
156	1.9.13	Grifería y columnas de ducha - Bloque J4	11 días	vie 09/07/27	mié 21/07/27	0%

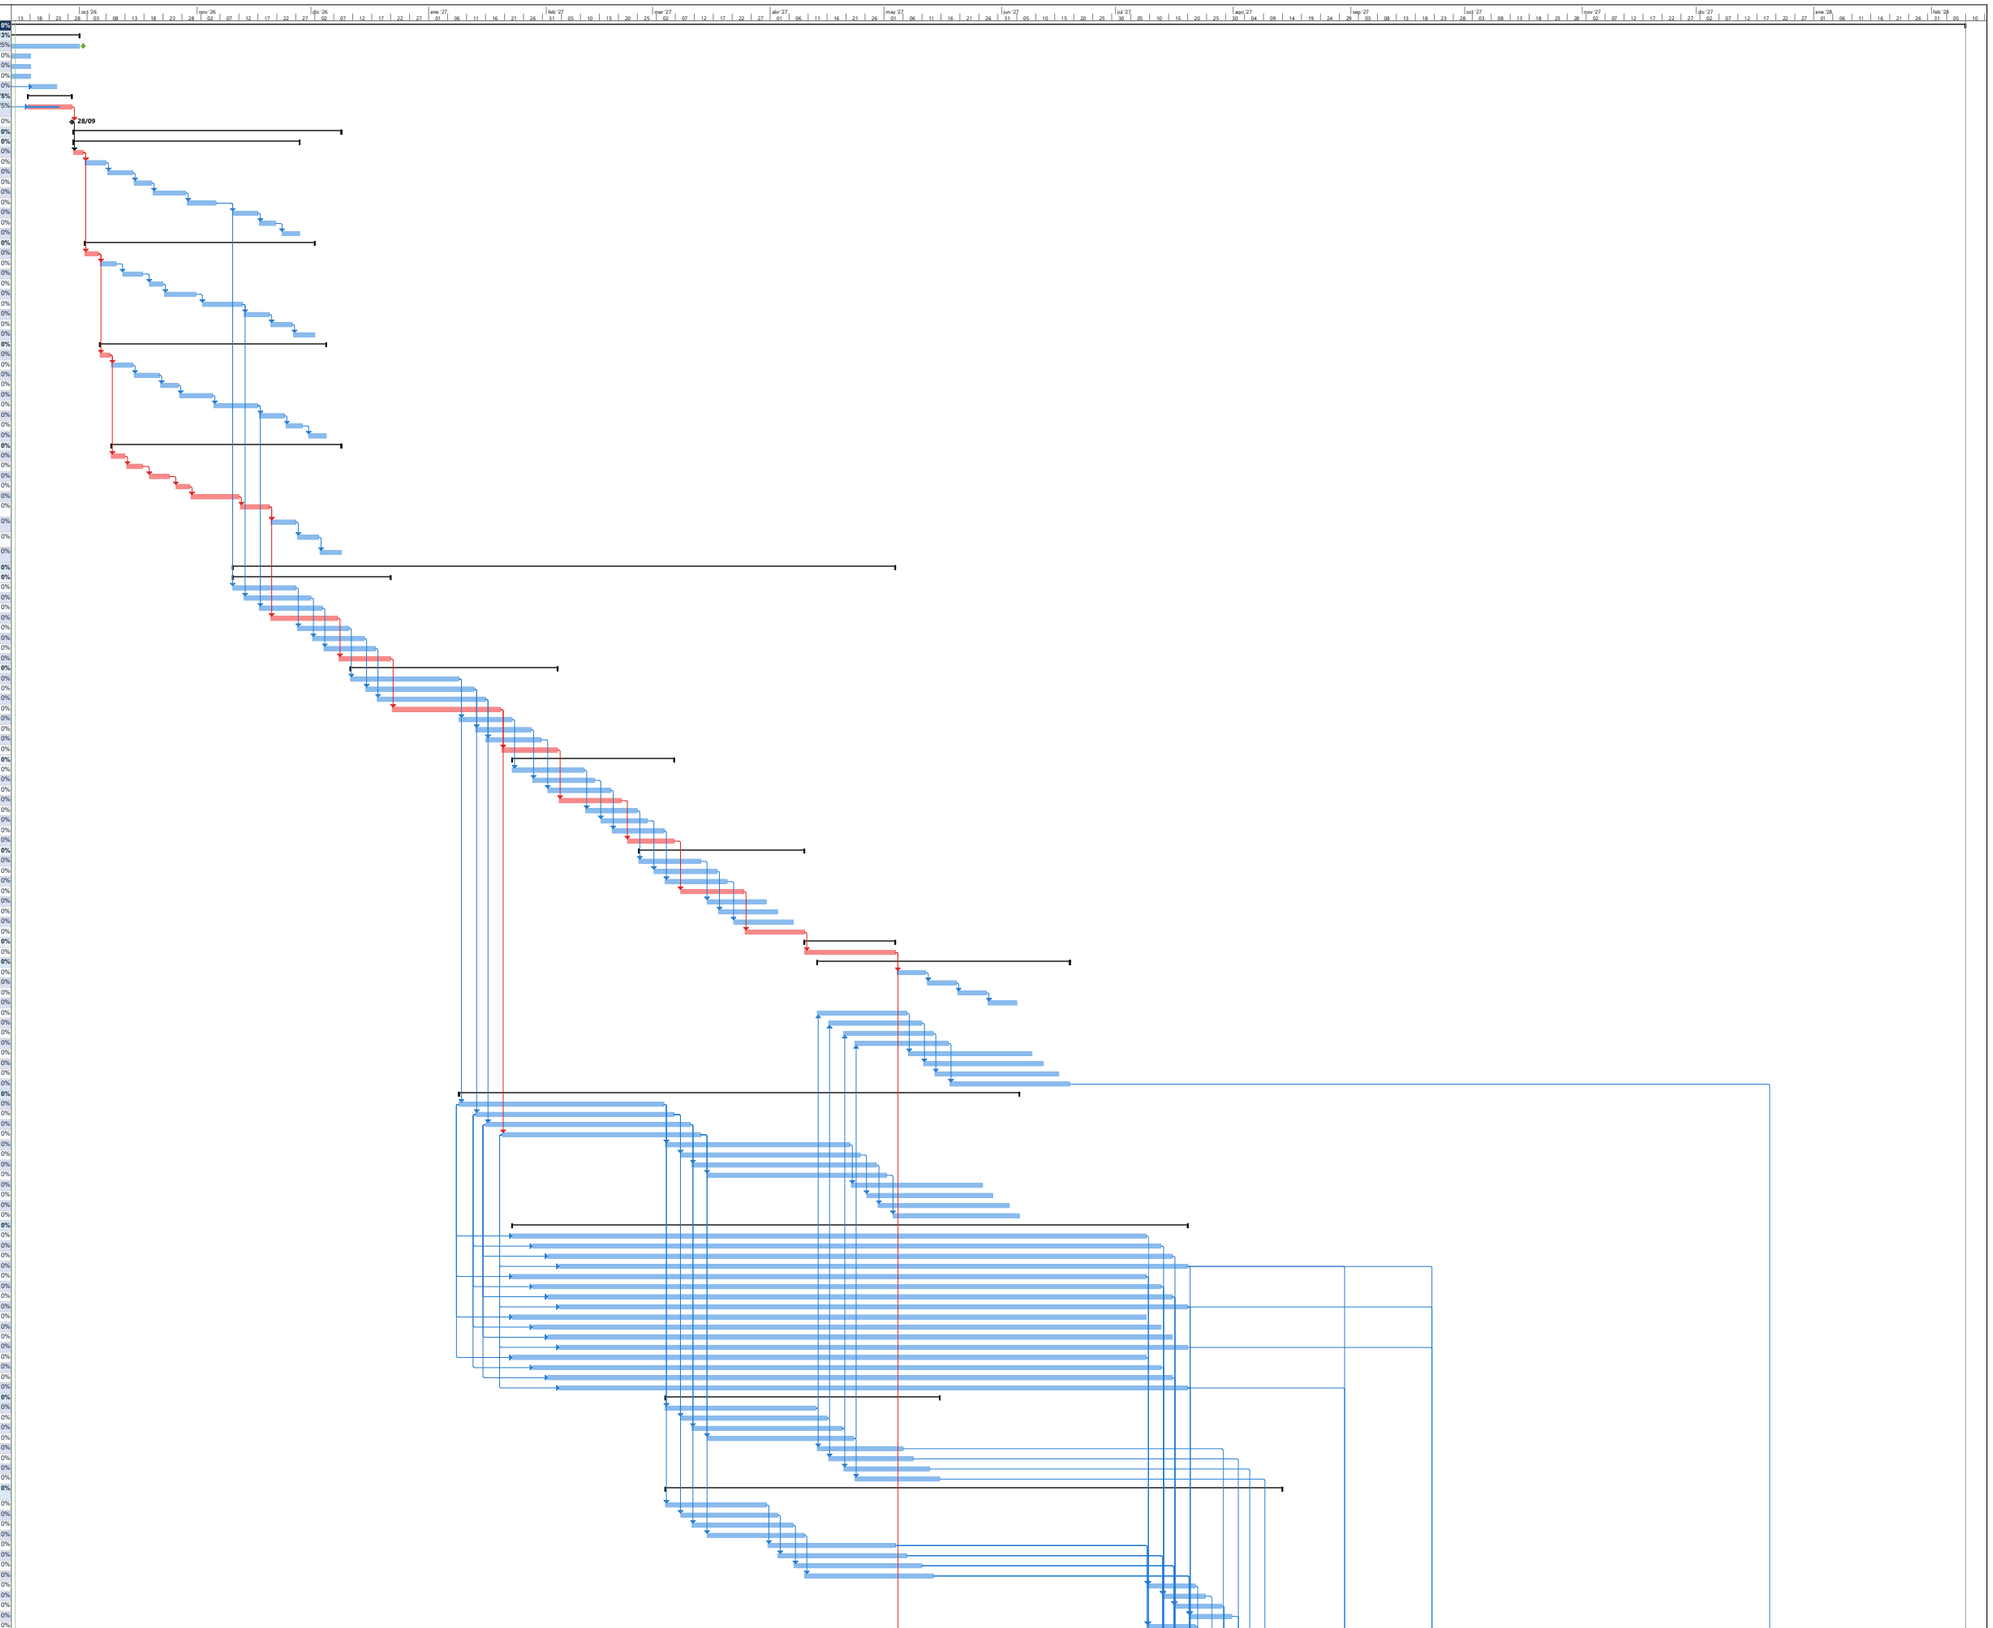

Proyecto: Cronograma_Botanic
Fecha: lun 14/09/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
157	1.9.14	Grifería y columnas de ducha - Bloque J3	11 días	mar 13/07/27	sáb 24/07/27	0%
158	1.9.15	Grifería y columnas de ducha - Bloque J2	11 días	vie 16/07/27	mié 28/07/27	0%
159	1.9.16	Grifería y columnas de ducha - Bloque J1	11 días	mar 20/07/27	sáb 31/07/27	0%
160	1.9.17	Mamparas de ducha - Bloque J4	11 días	jue 22/07/27	mar 03/08/27	0%
161	1.9.18	Mamparas de ducha - Bloque J3	11 días	lun 26/07/27	vie 06/08/27	0%
162	1.9.19	Mamparas de ducha - Bloque J2	11 días	jue 29/07/27	mar 10/08/27	0%
163	1.9.20	Mamparas de ducha - Bloque J1	11 días	lun 02/08/27	vie 13/08/27	0%
164	**1.10**	**FASE 9: FALSOS TECHOS**	**26 días**	**vie 09/07/27**	**sáb 07/08/27**	**0%**
165	1.10.1	Falso techo PVC - Bloque J4	17 días	vie 09/07/27	mié 28/07/27	0%
166	1.10.2	Falso techo PVC - Bloque J3	17 días	mar 13/07/27	sáb 31/07/27	0%
167	1.10.3	Falso techo PVC - Bloque J2	17 días	vie 16/07/27	mié 04/08/27	0%
168	1.10.4	Falso techo PVC - Bloque J1	17 días	mar 20/07/27	sáb 07/08/27	0%
169	**1.11**	**FASE 10: PINTURA**	**25 días**	**jue 29/07/27**	**jue 26/08/27**	**0%**
170	1.11.1	Pintura plástica interior - Bloque J4	16 días	jue 29/07/27	lun 16/08/27	0%
171	1.11.2	Pintura plástica interior - Bloque J3	16 días	lun 02/08/27	jue 19/08/27	0%
172	1.11.3	Pintura plástica interior - Bloque J2	16 días	jue 05/08/27	lun 23/08/27	0%
173	1.11.4	Pintura plástica interior - Bloque J1	16 días	lun 09/08/27	jue 26/08/27	0%
174	**1.12**	**FASE 11: CARPINTERÍA DE MADERA Y COCINAS DE HABITACIONES**	**46 días**	**mar 17/08/27**	**vie 08/10/27**	**0%**
175	1.12.1	Puertas de madera - Bloque J4	22 días	mar 17/08/27	vie 10/09/27	0%
176	1.12.2	Puertas de madera - Bloque J3	22 días	vie 20/08/27	mar 14/09/27	0%
177	1.12.3	Puertas de madera - Bloque J2	22 días	mar 24/08/27	vie 17/09/27	0%
178	1.12.4	Puertas de madera - Bloque J1	22 días	vie 27/08/27	mar 21/09/27	0%
179	1.12.5	Cocinas de habitaciones - Bloque J4	15 días	sáb 11/09/27	mar 28/09/27	0%
180	1.12.6	Cocinas de habitaciones - Bloque J3	15 días	mié 15/09/27	vie 01/10/27	0%
181	1.12.7	Cocinas de habitaciones - Bloque J2	15 días	sáb 18/09/27	mar 05/10/27	0%
182	1.12.8	Cocinas de habitaciones - Bloque J1	15 días	mié 22/09/27	vie 08/10/27	0%
183	**1.13**	**FASE 12: COCINAS INDUSTRIALES**	**55 días**	**mar 20/07/27**	**mar 21/09/27**	**0%**
184	1.13.1	Instalación de extracción y climatización específica	20 días	mar 20/07/27	mié 11/08/27	0%
185	1.13.2	Instalación de frío industrial	15 días	jue 12/08/27	sáb 28/08/27	0%
186	1.13.3	Suministro e instalación de equipos de cocina industrial	20 días	lun 30/08/27	mar 21/09/27	0%
187	**1.14**	**FASE 13: MOBILIARIO INTERIOR**	**63 días**	**mié 29/09/27**	**vie 10/12/27**	**0%**
188	1.14.1	Mobiliario de habitaciones - Bloque J4	20 días	mié 29/09/27	jue 21/10/27	0%
189	1.14.2	Mobiliario de habitaciones - Bloque J3	20 días	sáb 02/10/27	lun 25/10/27	0%
190	1.14.3	Mobiliario de habitaciones - Bloque J2	20 días	vie 22/10/27	sáb 13/11/27	0%
191	1.14.4	Mobiliario de habitaciones - Bloque J1	20 días	mar 26/10/27	mié 17/11/27	0%
192	1.14.5	Mobiliario de zonas comunes, restaurantes y spa	20 días	jue 18/11/27	vie 10/12/27	0%
193	**1.15**	**FASE 14: ZONAS COMUNES Y PISCINAS**	**85 días**	**mar 04/05/27**	**mar 10/08/27**	**0%**
194	1.15.1	Replanteo de zonas comunes y piscinas	5 días	mar 04/05/27	sáb 08/05/27	0%
195	1.15.2	Excavación del vaso de piscinas	11 días	lun 10/05/27	vie 21/05/27	0%
196	1.15.3	Cimentación y muros de piscinas (gunitado)	32 días	sáb 22/05/27	lun 28/06/27	0%
197	1.15.4	Muros de contención y jardineras (bloque)	15 días	mar 29/06/27	jue 15/07/27	0%
198	1.15.5	Losas de zonas comunes exteriores	22 días	vie 16/07/27	mar 10/08/27	0%
199	**1.16**	**FASE 15: URBANIZACIÓN, VERJA Y EXTERIORES**	**112 días**	**mié 11/08/27**	**sáb 18/12/27**	**0%**
200	1.16.1	Urbanización - Bloque J4	28 días	mié 11/08/27	sáb 11/09/27	0%
201	1.16.2	Urbanización - Bloque J3	28 días	lun 13/09/27	jue 14/10/27	0%
202	1.16.3	Urbanización - Bloque J2	28 días	vie 15/10/27	mar 16/11/27	0%
203	1.16.4	Urbanización - Bloque J1	28 días	mié 17/11/27	sáb 18/12/27	0%
204	**1.17**	**FASE 16: CERTIFICACIONES, PRUEBAS Y ENTREGA**	**102 días**	**lun 30/08/27**	**mié 09/02/28**	**0%**
205	1.17.1	Pruebas finales de instalaciones (PCI, fontanería y electricidad)	16 días	mié 22/09/27	sáb 09/10/27	0%
206	1.17.2	Pruebas finales de climatización y ventilación	11 días	lun 30/08/27	vie 10/09/27	0%
207	1.17.3	Corrección de incidencias y punch list	10 días	lun 11/10/27	jue 21/10/27	0%
208	1.17.4	Certificaciones, manuales de operación y documentación As-Built	10 días	lun 11/10/27	jue 21/10/27	0%
209	1.17.5	Limpieza general final	6 días	lun 20/12/27	mié 09/02/28	0%
210	1.17.6	Recepción final	0 días	mié 09/02/28	mié 09/02/28	0%

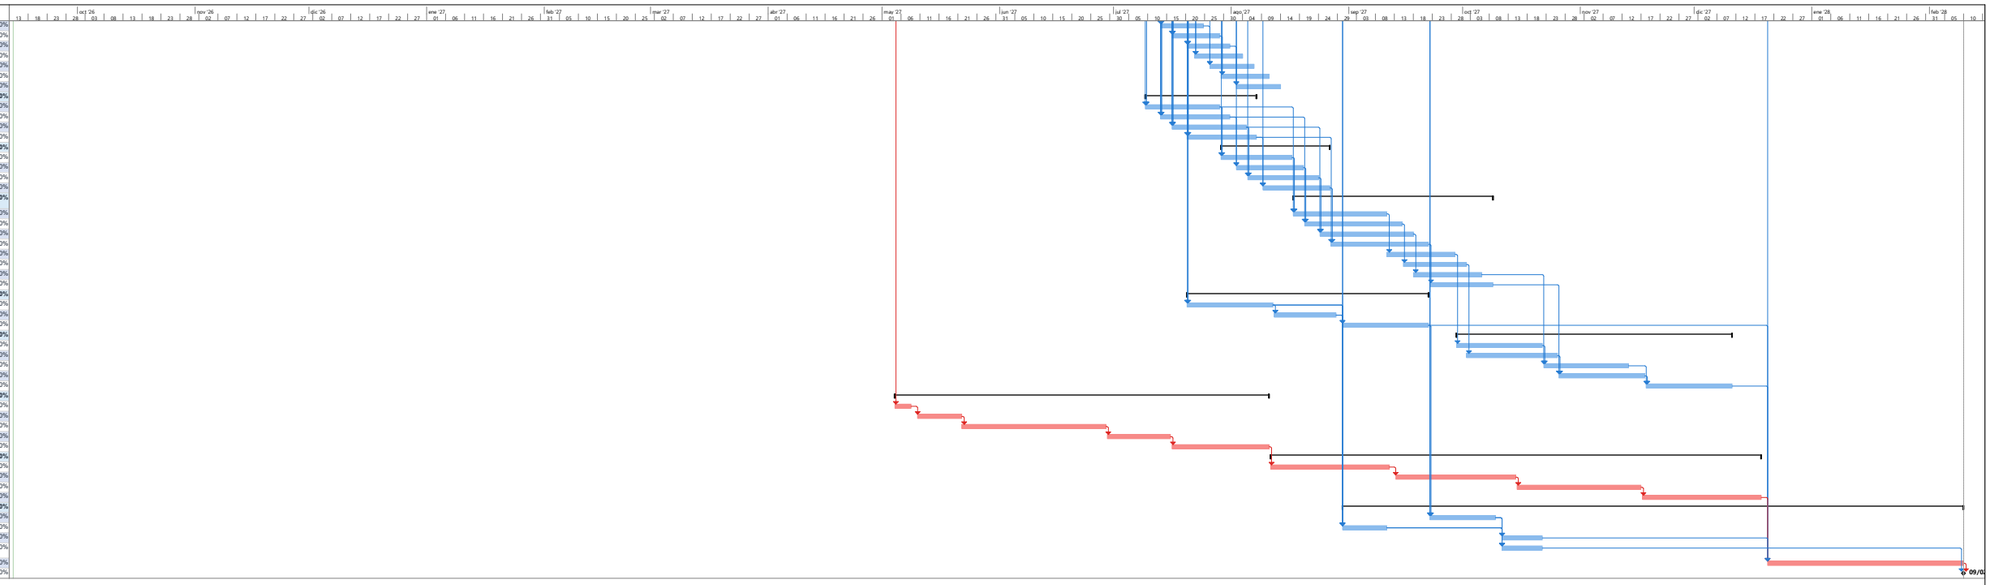

Proyecto: Cronograma_Botanic
Fecha: lun 14/09/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
